



PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

REF: CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.

À COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO,

O LICITANTE DAVID CONSTRUÇÕES LTDA DAVID CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 52.717.088/0001-60, COM SEDE NA RUA: OXALÁ, Nº 25 - PARANGABA - FORTALEZA-CE, REPRESENTADA POR SR. UESLEY OLIVEIRA DAVID, RG DE Nº 2008302511-6 SSPDS-CE E DE CPF DE Nº 065.485.003-85, APÓS TER ANALISADO MINUCIOSAMENTE TODO O CONTEÚDO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP, E SEUS ANEXOS E TER TOMADO CONHECIMENTO DO LOCAL E DE TODAS AS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, PROPÕE EXECUTAR O OBJETO LICITADO SOB NOSSA RESPONSABILIDADE PELO VALOR TOTAL DE R\$ 309.517,98 (TREZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), JÁ COMPUTADO O BDI, CONFORME DETALHAMENTO ABAIXO:

ITEM	OBRA	VR. TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	R\$ 309.517,98 (TREZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 309.517,98 (TREZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

RAZÃO SOCIAL: DAVID CONSTRUÇÕES LTDA

CNP E INSCRIÇÃO ESTADUAL: 52.717.088/0001-60 / 858397-2

ENDEREÇO COMERCIAL: RUA OXALÁ, 25 - PARANGABA - FORTALEZA - CEARÁ. CEP: 60740-560

TELEFONE/E-MAIL: (85) 988031662 / davidconstrucoes8@gmail.com

BANCO, AGÊNCIA E Nº DA CONTA: BRADESCO, AG: 0452, C/C: 159851-1

NOME DO REPRESENTANTE: UESLEY OLIVEIRA DAVID

CPF/RG: 065.485.003-85 / 20083022511-6

DECLARO QUE OS PREÇOS CONTIDOS NESTA PROPOSTA INCLUEM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS, TAIS COMO E SEM SE LIMITAR A: CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS, TRIBUTOS INCIDENTES, TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO, MATERIAIS, SERVIÇOS, ENCARGOS SOCIAIS, SEGUROS, BEM COMO TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, COMERCIAIS, FRETES E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM DIRETA OU INDIRETAMENTE NA EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA DISPENSA DE LICITAÇÃO.

HÁ PLENO ACORDO COM TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

FORTALEZA - CEARÁ - 12 de setembro de 2024.

ATENCIOSAMENTE,

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA.

DAVID
CONSTRUCOES
LTDA:5271708
8000160
Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUCOES
LTDA:52717088000160
Dados: 2024.09.12 14:58:56 -03'00'

UESLEY OLIVEIRA DAVID
RG 2008302511-6 SSPDS-CE
CPF: 065.485.003-85
SÓCIO PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL LEGAL.

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA.

WANDESON
PAULINO DA
SILVA:061664
98357
Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357
Dados: 2024.09.12 14:59:12 -03'00'

WANDESON PAULINO DA SILVA
CARTEIRA PROFISSIONAL DO CREA Nº 36641CE
CPF Nº 061.664.98-37
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60 / RUA: OXALÁ, Nº 25 - PARANGABA - FORTALEZA-CE, CEP: 60.740-560 / (85) 988031662 - davidconstrucoes8@gmail.com



DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA



EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP

EU, UESLEY OLIVEIRA DAVID, RG DE Nº 2008302511-6 SSPDS-CE E DE CPF DE Nº 065.485.003-85, COMO REPRESENTANTE DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO DA EMPRESA DAVID CONSTRUÇÕES LTDA DAVID CONSTRUÇÕES LTDA, INSCRITA NO CNPJ: 52.717.088/0001-60, COM SEDE NA RUA: OXALÁ, Nº 25 - PARANGABA - FORTALEZA-CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:

(A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE** FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELO LICITANTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(B) A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR **CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP**, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP**, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

(C) QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP**, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(D) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP**, NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA **CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP**, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

(E) QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DA **CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/CP**, NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA **PREFEITURA/COMISSÃO DE LICITAÇÃO** ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E,

(F) QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA – CEARÁ - 12 de setembro de 2024.

(85)988031662

CNPJ: 52.717.088/0001-60

ATENCIOSAMENTE, davidconstrucoes8@gmail.com

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA.
DAVID
CONSTRUÇOES
LTDA:52717088
000160

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUÇOES LTDA:52717088000160
Dados: 2024.09.12 14:59:38 -03'00'

UESLEY OLIVEIRA DAVID
RG 2008302511-6 SSPDS-CE
CPF: 065.485.003-85
SÓCIO PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL LEGAL

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA.
WANDESON
PAULINO DA
SILVA:06166498
357

Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357
Dados: 2024.09.12 14:59:25 -03'00'

WANDESON PAULINO DA SILVA
CARTEIRA PROFISSIONAL DO CREA Nº 36887CE
CPF Nº 061.664.98-37
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60 / RUA: OXALÁ, Nº 25 - PARANGABA - FORTALEZA-CE, CEP: 60.740-560 / (85) 988031662 - davidconstrucoes8@gmail.com

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE			DATA:	14/08/2024	BDI:	21,84%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE			FONTE:	VERBA	MORA:	MES
LOCAL:	TAMBORIL-CE			ORÇ. SEM DEDUÇÃO:	114,15%	114,15%:	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE			PROPOSTA:	PROPOSTA	6,99%:	6,99%

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO TOTAL (R\$)	%	
		MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO			OUTROS
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 8.721,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,43%	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 678,85	R\$ 1.633,52	R\$ 0,00	R\$ 253,88	R\$ 3.128,30	1,01%
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 4.833,41	R\$ 93,14%	
4	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 6.154,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.479,72	2,42%
TOTAL:		R\$	R\$	R\$ 0,00	R\$ 5.087,29	R\$ 100,00%	

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 172.111,48
VALOR ENCARGOS:	R\$ 81.931,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 254.043,31
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 122.741,12
VALOR MATERIAL:	R\$ 126.214,89
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 5.087,29
DEPRECIAÇÃO E JUROS:	R\$ 2.721,65
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 55.474,67
VALOR BDI:	R\$ 55.474,67
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR MÉDIO CRONOGRAMA:	R\$ 103.172,66
VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	R\$ 309.517,98
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 254.043,31
VALOR TOTAL:	R\$ 309.517,98

David

DAVID
CONSTRUCO
ES
LTDA-527170
88000160

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUÇÕES LTDA-5271708800
Dados: 2024.09.12 14:59:52 -03'00'


WANDESO
N PAULINO
DA
SILVA-0616
6498357

Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA-0616649835
Dados: 2024.09.12 15:00:06 -03'00'

TREZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE: SEINFRA PRÓPRIA VERSÃO: 028 SEM DECONEXÃO PRÓPRIA
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	BDI: 21,41% HORA: 3,37% 14,15% 2,00% 0,00%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$
1.1	COM-45708314	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PROPRI A	%	100,00	R\$ 106,26	R\$ 10.626,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 3.128,30
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFR A	HA	0,47	R\$ 586,39	R\$ 275,60
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFR A	M2	4.734,00	R\$ 0,11	R\$ 520,74
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFR A	M2	12,00	R\$ 194,33	R\$ 2.331,96
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO						R\$
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFR A	M2	4.260,60	R\$ 52,48	R\$ 223.596,29
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFR A	M	1.578,00	R\$ 31,93	R\$ 50.385,54
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFR A	M3	23,67	R\$ 61,70	R\$ 1.460,44
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFR A	M3	23,67	R\$ 542,53	R\$ 12.841,69
4	LIMPEZA DA OBRA						R\$ 7.479,72
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFR A	M2	4.734,00	R\$ 1,58	R\$ 7.479,72

VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 172.111,48
VALOR ENCARGOS:	R\$ 81.931,83
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 254.043,31
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 122.741,12
VALOR MATERIAL:	R\$ 126.214,89
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 5.087,29
DEPRECIACÃO E JUROS:	R\$ 2.721,55
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 55.474,67
VALOR BDI:	R\$ 55.474,67
VALOR BDI DIFERENCIADO:	R\$ 0,00
VALOR MÉDIO CRONOGRAMA:	R\$ 103.172,66
VALOR TOTAL CRONOGRAMA:	R\$ 309.517,98
VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 254.043,31
VALOR TOTAL:	R\$ 309.517,98

TREZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

DAVID
CONSTRUCOES
LTDA:5271708
8000160

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUCOES LTDA:5271708800016
Dados: 2024.09.12 15:00:20 -03'00'

WANDESON
PAULINO DA
SILVA:06166
498357

Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357
Dados: 2024.09.12 15:00:39 -03'00'

Handwritten signatures and initials.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA :	14/08/2024	BDI :	21,84%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	VERSIÃO	HORA:	MEB
LOCAL:	TAMBORIL-CE	SEM SEM DECONEXÃO	PROPRIA	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTO		
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								R\$ 8.721,00
1.1	COM-45708314	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PROPRIA	%	100,00	R\$ 87,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 87,21	R\$ 8.721,00
2		SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 2.566,26
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFR A	HA	0,47	R\$ 360,54	R\$ 84,18	R\$ 0,00	R\$ 36,56	R\$ 481,28
2.2	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	SEINFR A	M2	4.734,00	R\$ 0,02	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,05	R\$ 0,09
2.3	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFR A	M2	12,00	R\$ 34,56	R\$ 124,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159,50
3		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO								R\$
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFR A	M2	4.260,60	R\$ 18,52	R\$ 23,86	R\$ 0,00	R\$ 0,69	R\$ 43,07
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFR A	M	1.578,00	R\$ 14,57	R\$ 10,44	R\$ 0,00	R\$ 1,20	R\$ 26,21
3.3	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFR A	M3	23,67	R\$ 50,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50,64
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFR A	M3	23,67	R\$ 172,82	R\$ 272,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 445,28
4		LIMPEZA DA OBRA								R\$ 6.154,20
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFR A	M2	4.734,00	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,30	R\$ 6.154,20

VALOR SEM ENCARGOS: R\$ 172.111,48
 VALOR ENCARGOS: R\$ 81.931,83
 VALOR COM ENCARGOS: R\$ 254.043,31
 VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 123.741,12
 VALOR MATERIAL: R\$ 126.214,89
 VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00
 VALOR OUTROS: R\$ 5.087,20
 DEPRECIAÇÃO E JUROS: R\$ 2.721,65


 X
 David

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
 DE TAMBORIL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE
 VALOR ENCARGOS: R\$ 81.931,83
 VALOR COM ENCARGOS: R\$ 254.043,31
 VALOR MÃO DE OBRA: R\$ 123.741,12
 VALOR MATERIAL: R\$ 126.214,89
 VALOR EQUIPAMENTOS: R\$ 0,00
 VALOR OUTROS: R\$ 5.087,20
 DEPRECIAÇÃO E JUROS: R\$ 2.721,65

VALOR BDI TOTAL: R\$ 55.474,67
VALOR BDI: R\$ 55.474,67
VALOR BDI DIFERENCIADO: R\$ 0,00
VALOR MÉDIO CRONOGRAMA: R\$ 103.172,66
VALOR TOTAL CRONOGRAMA: R\$ 309.517,98
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 254.043,31
VALOR TOTAL: R\$ 309.517,98

TREZENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS

D. Ambrósio

DAVID
CONSTRUCO
ES
LTDA:527170
88000160


Assinado de forma
digital por DAVID
CONSTRUCOES
LTDA-5271708800
0160

Dados: 2024.09.12
15:01:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOREI
COMISSÃO

Assinado digital por
WANDESON
PAULINO DA
SILVA:06167
6498357

Dados: 2024.09.12
15:00:59 -03'00'

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	SEINFRA PRÓPRIA
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	VERSÃO:	028 SEM DESONDAÇÃO PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE			BDI: 21,84%



1.1. COM-45708314 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584 ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,14535120	R\$ 19.999,74
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 2.906,99

VALOR:	R\$ 87,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.630,84
VALOR ENCARGOS:	R\$ 1.276,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.906,99
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 87,21
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 87,21
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 19,05
VALOR COM BDI:	R\$ 106,26
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.905,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 10.626,00

2.1. C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

Equipamento Custo Horário	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 71,1600
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 1,1800
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 2,3200
TOTAL Equipamento Custo Horário:				R\$ 156,3200

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	3,41200000	R\$ 21,1000
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	3,41200000	R\$ 29,9400
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,26500000	R\$ 35,6000
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 324,9589

VALOR:	R\$ 481,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 250,64
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 230,64
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 481,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 481,28
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 360,54
VALOR MATERIAL:	R\$ 84,18
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 36,56
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 105,11
VALOR COM BDI:	R\$ 586,39
TOTAL MATERIAL:	R\$ 39,56

Handwritten signature

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	S28 SEM DESONERACÃO
LOCAL:	TAMBORIL-CE		PRÓPRIA	HORA:	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE		PRÓPRIA	MIN:	71,31%



VALOR BDI TOTAL:	R\$ 49,40
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 275,60

2.2. C3232 RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 120,7800	R\$ 0,0000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00027778	R\$ 291,2900	R\$ 0,0809
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,0809

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,00047389	R\$ 20,2600	R\$ 0,0096
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,0096

VALOR:	R\$ 0,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,08
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 0,09
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 0,09
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,02
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,02
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,05
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 0,02
VALOR COM BDI:	R\$ 0,11
TOTAL MATERIAL:	R\$ 94,68
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 94,68
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 520,74

2.3. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 33,2900	R\$ 33,9558
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 27,1900	R\$ 27,1900
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 13,7200	R\$ 61,7400
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 13,6400	R\$ 2,0460
TOTAL Material:						R\$ 124,9318

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70600000	R\$ 20,2600	R\$ 34,5636
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 34,5636

VALOR:	R\$ 159,50
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 135,29
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 24,21
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 159,50
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 159,50
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 34,56

(Handwritten signature and initials)

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS		DATA : 14/08/2024		BDI : 21,84%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	SEINFRA	VERBÃO:	028 SEM DESONERAZÃO	HORA:	114,15%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE		PRÓPRIA		PRÓPRIA	MES:	71,31%
LOCAL:	TAMBORIL-CE						
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE						



VALOR MATERIAL:	R\$ 324,94
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 34,83
VALOR COM BDI:	R\$ 194,33
TOTAL MATERIAL:	R\$ 1.499,28
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 417,96
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.331,96

3.1. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	R\$ 26,1900	R\$ 1,3095
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	R\$ 107,0800	R\$ 1,0708
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,3803

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 59,7100	R\$ 8,9565
11600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	R\$ 96,6000	R\$ 14,4900
TOTAL Material:						R\$ 23,4465

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,25590000	R\$ 26,8600	R\$ 6,8735
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,51180000	R\$ 20,2600	R\$ 10,3691
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 17,2426

VALOR:	R\$ 43,07
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 30,42
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 12,65
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,07
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 43,07
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 18,52
VALOR MATERIAL:	R\$ 23,86
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,69
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 9,41
VALOR COM BDI:	R\$ 52,48
TOTAL MATERIAL:	R\$ 101.657,92
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 40.092,25
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 223.596,29

3.2. C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,7400	R\$ 3,7400
TOTAL Material:						R\$ 3,7400

Mão de Obra		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Amulo

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS							
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024				
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	BDI:	21,84%				
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	VERSIÃO:	008 SEM DESONERACÃO				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PROPRIA:	PROPRIA	<table border="1"> <tr> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> </table>	HORA	MES	114,15%	71,31%
HORA	MES							
114,15%	71,31%							



12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,12795000	R\$ 20,2600	R\$ 3,4367
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,21325000	R\$ 20,2600	R\$ 4,3204
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,7571

Serviço	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	0,25000000	R\$ 4,9600	R\$ 1,2400
C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,03400000	R\$ 371,1100	R\$ 12,6177
C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	0,03700000	R\$ 4,5100	R\$ 0,1669
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	0,01500000	R\$ 45,8000	R\$ 0,6870
TOTAL Serviço:				R\$ 14,7115

VALOR:	R\$ 26,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 16,23
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 9,98
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,21
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 26,21
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 14,57
VALOR MATERIAL:	R\$ 10,44
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 1,20
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 5,72
VALOR COM BDI:	R\$ 31,93
TOTAL MATERIAL:	R\$ 16.474,32
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 9.026,16
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 50.385,54

3.3. C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,49929000	R\$ 20,2600	R\$ 50,6356
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 50,6356

VALOR:	R\$ 50,64
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 15,17
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 35,47
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 50,64
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 50,64
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 50,64
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 11,06
VALOR COM BDI:	R\$ 61,70
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 261,79
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.460,44

Handwritten signature and initials.

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024	BDI:	21,84%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE	VERSÃO	HORAS	MES
LOCAL:	TAMBORIL-CE	SEINFRA	008 SEM DESONERAÇÃO	11,75%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%



3.4. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 71,2900	R\$ 55,4636
10280 BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 85,7300	R\$ 82,7980
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,6100	R\$ 134,2000
TOTAL Material:					R\$ 272,4616

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	8,53000000	R\$ 20,2600	R\$ 172,8178
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 172,8178

VALOR:	R\$ 445,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 324,24
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 121,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 445,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 445,28
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 172,82
VALOR MATERIAL:	R\$ 272,46
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 97,25
VALOR COM BDI:	R\$ 542,53
TOTAL MATERIAL:	R\$ 6.449,13
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 2.301,91
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 12.841,69

4.1. C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)


Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,06397500	R\$ 20,2600	R\$ 1,2961
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 1,2961

VALOR:	R\$ 1,30
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 0,39
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 0,91
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,30
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,30
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,30
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 0,28
VALOR COM BDI:	R\$ 1,58
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.325,52
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 7.479,72

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA
 Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUÇÕES LTDA:52717088000160
 Dados: 2024.09.12 15:01:41 -03'00'

WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357
 Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357
 Dados: 2024.09.12 15:01:58 -03'00'

Amb

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/06/2024
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	TAMBORIL-CE	SEINFRA	SEM DESONERAC	114,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA		



COM-45708314 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,14535120	R\$ 19.999,74
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 2.906,99



VALOR:	R\$ 87,21
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1.630,84
VALOR ENCARGOS (71,31%):	R\$ 1.276,15
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2.906,99
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 87,21
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 2.906,99
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 19,05
VALOR COM BDI:	R\$ 106,26
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 19,05
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 106,26

DAVID
CONSTRUCO
ES
LTDA:527170
88000160

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUCCES LTDA:52717088000160
Dados: 2024.09.12 15:02:14 -03'00'

WANDES
N PAULINO
DA
SILVA:0616
6498357

Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357
Dados: 2024.09.12 15:02:28 -03'00'

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	SEINFRA
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	VERSÃO:	028 SEM DESCHEREAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PROPRIA:	PROPRIA	BDI: 21,84% HORA: 114,15% M3: 71,31% 0,00% 

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 105,2200	R\$ 0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01388889	R\$ 307,1900	R\$ 4,2665
10666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 92,0600	R\$ 0,0639
10779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 259,4800	R\$ 3,4237
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 7,7541

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVEANTE	SEINFRA	H	0,02389445	R\$ 20,2600	R\$ 0,4800
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,4800

VALOR:	R\$ 8,23
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 7,42
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 0,81
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 8,23
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 8,23
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 1,24
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,90
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 4,09
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 1,80
VALOR COM BDI:	R\$ 10,03
TOTAL MATERIAL:	R\$ 143,09
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 88,81
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 494,88

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
TOTAL Geral:						R\$ 21,7400

VALOR:	R\$ 21,74
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 8,47
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 21,74
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 21,74
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 1,52
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 4,75
VALOR COM BDI:	R\$ 26,49

Handwritten signature

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES														
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE		DATA: 14/08/2024	BDI: 21,84%										
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE		<table border="1"> <tr> <th>FONTES</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERACAO</td> <td>11h</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,02%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTES	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	11h	71,31%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,02%	0,00%	
FONTES	VERSÃO	HORA	MES													
SEINFRA	028 SEM DESONERACAO	11h	71,31%													
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,02%	0,00%													
LOCAL:	TAMBORIL-CE															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE															

TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP) (H)

Genl		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 4,7900	R\$ 4,7900
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67260000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6726
TOTAL Genl:						R\$ 27,2026

VALOR:	R\$ 27,20
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,94
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,20
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,20
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,79
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 2,19
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 5,94
VALOR COM BDI:	R\$ 33,14
TOTAL MATERIAL:	R\$ 256,98
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 318,68
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.777,96


103253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 83,2800	R\$ 1,3186
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 216,5600	R\$ 5,5945
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 309,4900	R\$ 0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 591,3000	R\$ 24,6375
10626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 32,3000	R\$ 0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 155,2200	R\$ 6,4675
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 38,0181

Material		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 22.675,3000	R\$ 9,0701
TOTAL Material:						R\$ 9,0701

Mão de Obra		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,17770833	R\$ 20,2600	R\$ 3,6004
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,6004

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 14/08/2024	BDI : 21.84%
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE				

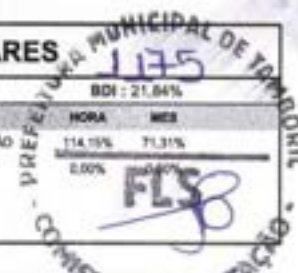

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	DE TOTAL	
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 38,4200	R\$ 42,2820
					TOTAL Serviço:	R\$ 42,2820

VALOR:	R\$ 92,95
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 78,21
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 16,74
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 92,95
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 92,95
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 24,64
VALOR MATERIAL:	R\$ 38,41
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 31,90
VALOR BDI (21.84%):	R\$ 20,30
VALOR COM BDI:	R\$ 113,25
TOTAL MATERIAL:	R\$ 1.632,99
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 910,45
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.079,26

C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2496	SUPERCAL	SEINFRA	KG	0,30000000	R\$ 1,2500	R\$ 0,3750
					TOTAL Material:	R\$ 0,3750

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,17060000	R\$ 26,8600	R\$ 4,5823
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,5823

VALOR:	R\$ 4,96
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,92
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 3,04
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,96
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 4,96
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 4,58
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,38
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21.84%):	R\$ 1,08
VALOR COM BDI:	R\$ 6,04
TOTAL MATERIAL:	R\$ 149,91
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 426,06
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.382,78

I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP) (H)

Genal	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,7900	R\$ 17,7900

Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 14/08/2024	BDI : 21,84%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FORTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE		

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR BDI
12747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 42,0900	R\$ 42,0900
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9834
12702	JUROS	SEINFRA	H	1,30820000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3082
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	4,98340000	R\$ 1,0000	R\$ 4,9834
TOTAL Geral:					R\$ 71,1550	

VALOR:	R\$ 71,16
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 59,18
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 11,98
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 71,16
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 71,16
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 17,79
VALOR MATERIAL:	R\$ 42,09
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 11,28
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 15,54
VALOR COM BDI:	R\$ 86,70
TOTAL MATERIAL:	R\$ 39,56
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 14,61
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 81,50

10594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI) (H)

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI
12753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,8800	R\$ 27,8800
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
TOTAL Geral:					R\$ 83,2772	

VALOR:	R\$ 83,28
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 66,03
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 83,28
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 83,28
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 55,60
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 18,19
VALOR COM BDI:	R\$ 101,47
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12,91
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 72,04

10708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

Item	Descrição	Unid	Quant	Valor Unitário	Valor Total	Valor BDI
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 72,0400	R\$ 72,0400

P. Ambrósio

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES					
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/06/2024	BDI: 21,84%	
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	SE2 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	HORA:	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE			MESES:	71,31%	



ID	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,6800	R\$ 27,6800
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 70,9300	R\$ 70,9300
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
I2702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3520
TOTAL Geral:						R\$ 216,5592

VALOR:	R\$ 216,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 199,31
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 216,56
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 216,56
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 70,93
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 117,95
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 47,30
VALOR COM BDI:	R\$ 263,86
TOTAL MATERIAL:	R\$ 82,28
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 54,87
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 306,08

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI) (H)

Item	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,6800	R\$ 27,6800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
I2702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:						R\$ 105,2168

VALOR:	R\$ 105,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 87,97
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 105,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 105,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 77,54
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 22,98
VALOR COM BDI:	R\$ 128,20
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

Handwritten signature

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 14/06/2024		BDI : 21,84%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FORTE	VERSÃO	HORA			
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	08 SEM DEBONERAÇÃO	114,15%			
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	8,00%			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE						

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)

Genl		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,6800	R\$ 27,6800
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 115,0200	R\$ 115,0200
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	86,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 86,9571
TOTAL Genl:						R\$ 307,1938

VALOR:	R\$ 307,19
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 289,95
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,24
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 307,19
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 307,19
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,67
VALOR MATERIAL:	R\$ 115,02
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 164,50
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 67,09
VALOR COM BDI:	R\$ 374,28
TOTAL MATERIAL:	R\$ 128,82
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 75,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 419,19

10724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP) (H)

Genl		FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
12769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 2,5600	R\$ 2,5600
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	1,37200000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3720
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,30330000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3033
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,73300000	R\$ 1,0000	R\$ 1,7330
TOTAL Genl:						R\$ 26,1883

VALOR:	R\$ 26,19
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,92
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 26,19
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 26,19
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,56
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 3,41
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 5,72

Arnelo

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 14/08/2024	BDI : 21,84%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	VERBA:	028 SEM DESONERAÇÃO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	114,15%
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE		



VALOR COM BDI:	R\$ 31,91
TOTAL MATERIAL:	R\$ 545,36
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 1.218,53
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 6.797,79

I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP) (H)

Genl		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,6800	R\$ 27,6800
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 28,1200	R\$ 28,1200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
I2702	JUROS	SEINFRA	H	7,32510000	R\$ 1,0000	R\$ 7,3251
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	21,97520000	R\$ 1,0000	R\$ 21,9752
TOTAL Genl:						R\$ 107,0795

VALOR:	R\$ 107,08
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 89,82
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 107,08
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 107,08
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,67
VALOR MATERIAL:	R\$ 28,12
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 51,29
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 23,39
VALOR COM BDI:	R\$ 130,47
TOTAL MATERIAL:	R\$ 1.198,19
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 996,65
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.559,33

I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI) (H)

Genl		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2778	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
I2702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
TOTAL Genl:						R\$ 43,9799

VALOR:	R\$ 43,98
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 30,71
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 43,98
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 43,98
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00

(Handwritten signature and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
LOCAL:	TAMBORIL-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

DATA : 14/08/2024

BOI : 21,84%

FUNTE	VERSÃO	HORA	REB
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	144000	0,00%
PRÓPRIA	PRÓPRIA		



VALOR OUTROS:	R\$ 23,76
VALOR BOI (21,84%):	R\$ 9,61
VALOR COM BOI:	R\$ 53,59
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BOI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BOI:	R\$ 0,00

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)

Quant	Descrição	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
12775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 60,0700	R\$ 60,0700
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79990000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7999
TOTAL Geral:						R\$ 123,8498

VALOR:	R\$ 123,85
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 110,58
VALOR ENCARGOS (114,19%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 123,85
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 123,85
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 60,07
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 43,56
VALOR BOI (21,84%):	R\$ 27,05
VALOR COM BOI:	R\$ 150,90
TOTAL MATERIAL:	R\$ 174,20
VALOR BOI TOTAL:	R\$ 78,44
VALOR TOTAL COM BOI:	R\$ 437,61

C3268 CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

Equipamento Custo Horário	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 21,7400	R\$ 0,0000
10680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,2000	R\$ 27,2000
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 27,2000

Material	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,6100	R\$ 154,9400
TOTAL Material:					R\$ 154,9400

Mão de Obra	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	5,11800000	R\$ 20,2600	R\$ 103,6907
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 103,6907

Serviço	FUNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Handwritten signature and initials

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES										
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024	BDI: 21,84%							
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE: SEINFRA	VERSÃO: 028 SEM DESONERAÇÃO	<table border="1"> <tr> <td>OBRA</td> <td>MIS</td> </tr> <tr> <td>14,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	OBRA	MIS	14,15%	71,31%	0,00%	0,00%
	OBRA	MIS								
	14,15%	71,31%								
0,00%	0,00%									
LOCAL: TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA								
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE										

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 103,300	R\$ 7,569
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 92,950	R\$ 3,770
TOTAL Serviço:						R\$ 85,2753

VALOR:	R\$ 371,11
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 270,48
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 100,63
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 371,11
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 371,11
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 145,64
VALOR MATERIAL:	R\$ 192,83
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 32,64
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 81,05
VALOR COM BDI:	R\$ 452,16
TOTAL MATERIAL:	R\$ 10.345,33
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 4.348,33
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 24.258,38

I0618 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI) (H)

Genl		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2751	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,6800	R\$ 27,6800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
I2702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
TOTAL Genl:						R\$ 309,4906

VALOR:	R\$ 309,49
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 292,24
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 309,49
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 309,49
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 281,81
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 67,59
VALOR COM BDI:	R\$ 377,08
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)

Genl		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2751	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,6800	R\$ 27,6800

Handwritten signature



	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/06/2024
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	BDI: 21,84%
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE		

12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
					TOTAL Geral:	R\$ 563,6211

VALOR:	R\$ 591,30
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 574,05
VALOR ENCARGOS (114,19%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 591,30
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 591,30
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 563,62
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 129,14
VALOR COM BDI:	R\$ 720,44
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 241,49
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.347,22

C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	SEINFRA	H	0,00007519	R\$ 105,2200	R\$ 0,0079
10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00744361	R\$ 307,1900	R\$ 2,2866
10666 TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 92,0600	R\$ 0,0000
10779 TRATOR DE ESTEIRAS CILÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00751880	R\$ 259,4800	R\$ 1,9510
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 4,2455

Mão de Obra	FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282706	R\$ 20,2600	R\$ 0,2599
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 0,2599

VALOR:	R\$ 4,51
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,06
VALOR ENCARGOS (114,19%):	R\$ 0,45
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,51
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 4,51
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 1,60
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 2,23
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 0,98
VALOR COM BDI:	R\$ 5,49
TOTAL MATERIAL:	R\$ 93,42
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 57,22
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 320,56

Handwritten signatures and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1183
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
LOCAL:	TAMBORIL-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

DATA:	14/08/2024	BDI:	21,84%
FONTES	VERBA	QUOTA	MEZ
SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO	114,15%	7,00%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M (M3)

Mão de Obra	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	H	2,26045000	R\$ 20,2800	R\$ 45,7967
TOTAL Mão de Obra:				R\$ 45,7967

VALOR:	R\$ 45,80
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 13,72
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 32,08
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 45,80
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 45,80
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 45,80
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 10,00
VALOR COM BDI:	R\$ 55,80
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 236,70
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.320,79

I0626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI) (H)

Genl	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
I2701 DEPRECIÇÃO	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
I2702 JUROS	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
TOTAL Genl:				R\$ 32,2958

VALOR:	R\$ 32,30
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 19,03
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 32,30
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 32,30
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 12,08
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 7,05
VALOR COM BDI:	R\$ 39,35
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

Genl	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
------	------	-------------	----------------	-------

David

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 14/08/2024	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	VERÃO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	028 SEM DEBONERAÇÃO
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE		



12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 115,0200	R\$ 115,0200
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000

TOTAL Geral:	R\$ 155,2158
VALOR:	R\$ 155,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 141,95
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 155,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 155,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 115,02
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 19,98
VALOR BDI (21.84%):	R\$ 33,90
VALOR COM BDI:	R\$ 189,12
TOTAL MATERIAL:	R\$ 215,09
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 63,39
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 353,65

12716 MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Mão de Obra	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12548	OPERADOR DE BETONEIRA	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 23,7100	R\$ 20,2246
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,2246	

VALOR:	R\$ 20,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,95
VALOR ENCARGOS (114.15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 20,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21.84%):	R\$ 4,42
VALOR COM BDI:	R\$ 24,64
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 237,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.321,94

12715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

Material	FORTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 4,2600	R\$ 4,7925

Amulo



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES											
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024									
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>NORDE</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESOBERAÇÃO</td> <td>14,17%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>85,83%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	NORDE	SEINFRA	028 SEM DESOBERAÇÃO	14,17%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	85,83%
FORTE	VERSÃO	NORDE									
SEINFRA	028 SEM DESOBERAÇÃO	14,17%									
PRÓPRIA	PRÓPRIA	85,83%									
LOCAL:	TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>BDI</th> <th>21,84%</th> </tr> <tr> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	BDI	21,84%	0,00%	0,00%					
BDI	21,84%										
0,00%	0,00%										
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE										

TOTAL Material:	R\$ 4,7925
VALOR:	R\$ 4,79
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 4,79
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 4,79
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 4,79
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 4,79
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 1,05
VALOR COM BDI:	R\$ 5,84
TOTAL MATERIAL:	R\$ 256,98
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 56,34
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 313,32

I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2707 GASOLINA	SEINFRA	L	9,72000000	R\$ 4,3300	R\$ 42,0876
TOTAL Material:					R\$ 42,0876

VALOR:	R\$ 42,09
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 42,09
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 42,09
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 42,09
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 42,09
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 9,19
VALOR COM BDI:	R\$ 51,28
TOTAL MATERIAL:	R\$ 39,56
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8,64
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 48,20

I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	16,85000000	R\$ 4,2600	R\$ 70,9290
TOTAL Material:					R\$ 70,9290

VALOR:	R\$ 70,93
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 70,93
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 70,93

[Handwritten signature]

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1180		DATA : 14/08/2024	BDI : 21,84%
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE	VERSÃO
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERVAÇÃO
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE			

VALOR UNITÁRIO:	R\$ 70,93
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 70,93
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 15,49
VALOR COM BDI:	R\$ 86,42
TOTAL MATERIAL:	R\$ 82,28
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 17,97
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 100,25

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,2600	R\$ 115,0200
TOTAL Material:					R\$ 115,0200

VALOR:	R\$ 115,02
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 115,02
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 115,02
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 115,02
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 115,02
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 25,12
VALOR COM BDI:	R\$ 140,14
TOTAL MATERIAL:	R\$ 128,82
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 28,14
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 156,96


12820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	21,00000000	R\$ 4,2600	R\$ 89,4600
TOTAL Material:					R\$ 89,4600

VALOR:	R\$ 89,46
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 89,46
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 89,46
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 89,46
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 89,46
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00

Handwritten signature and initials

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/06/2024
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	1187
LOCAL:	TAMBORIL-CE	SEINFRA PRÓPRIA:	SEINFRA PRÓPRIA	HORA:	114,15
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE			MES:	0,00%

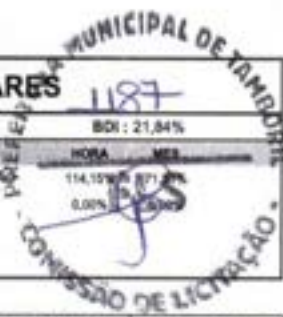

VALOR BDI (21,84%):	R\$ 19,54
VALOR COM BDI:	R\$ 109,00
TOTAL MATERIAL:	R\$ 118,09
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 25,79
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 143,88

I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	8,80000000	R\$ 4,2600	R\$ 28,1160
TOTAL Material:					R\$ 28,1160

VALOR:	R\$ 28,12
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 28,12
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 28,12
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 28,12
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 28,12
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 6,14
VALOR COM BDI:	R\$ 34,26
TOTAL MATERIAL:	R\$ 1.198,19
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 261,63
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.459,82

I2769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) (H)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2706 OLEO DIESEL	SEINFRA	L	0,60000000	R\$ 4,2600	R\$ 2,5560
TOTAL Material:					R\$ 2,5560

VALOR:	R\$ 2,56
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,56
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,56
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 2,56
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 2,56
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 0,56
VALOR COM BDI:	R\$ 3,12
TOTAL MATERIAL:	R\$ 545,36
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 119,29
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 664,65

Handwritten signature and initials.

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DEGRADATION
LOCAL:	TAMBORIL-CE		PRÓPRIA	HORA:	1440:00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE			MEB:	0,00%



12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 4,2600	R\$ 60,0660
TOTAL Material:						R\$ 60,0660

VALOR:	R\$ 60,07
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 60,07
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 60,07
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 60,07
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 60,07
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 13,12
VALOR COM BDI:	R\$ 73,19
TOTAL MATERIAL:	R\$ 174,20
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 38,05
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 212,25

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)


Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 4,2600	R\$ 115,0200
TOTAL Material:						R\$ 115,0200

VALOR:	R\$ 115,02
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 115,02
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 115,02
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 115,02
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 115,02
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 25,12
VALOR COM BDI:	R\$ 140,14
TOTAL MATERIAL:	R\$ 215,09
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 46,97
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 262,06

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Material		FONTE	UND	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	23,25000000	R\$ 4,2600	R\$ 99,0450
TOTAL Material:						R\$ 99,0450

[Handwritten signature]

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/05/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	BDI: 21,84%												
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%													
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														



VALOR:	R\$ 99,05
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 99,04
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,01
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 99,05
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 99,05
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 99,05
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 21,63
VALOR COM BDI:	R\$ 120,68
TOTAL MATERIAL:	R\$ 107,96
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 23,58
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 131,54

I0642 MOTO NIVELADORA (CHI) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,6200	R\$ 31,6200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
TOTAL Geral:						R\$ 120,7782

VALOR:	R\$ 120,78
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 101,43
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 19,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 120,78
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 120,78
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 31,62
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 89,16
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 26,36
VALOR COM BDI:	R\$ 147,16
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

I0756 MOTO NIVELADORA (CHP) (H)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,6200	R\$ 31,6200
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 89,4600	R\$ 89,4600
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	64,84230000	R\$ 1,0000	R\$ 64,8423
I2702	JUROS	SEINFRA	H	24,31590000	R\$ 1,0000	R\$ 24,3159
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	81,05290000	R\$ 1,0000	R\$ 81,0529

Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA : 14/08/2024	BDI : 21,84%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	VERSAO	114,18%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	0,00%
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE		



TOTAL Geral:	R\$ 291,2911
VALOR:	R\$ 291,29
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 271,95
VALOR ENCARGOS (114,18%):	R\$ 19,34
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 291,29
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 291,29
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 31,62
VALOR MATERIAL:	R\$ 89,46
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 170,21
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 63,62
VALOR COM BDI:	R\$ 354,91
TOTAL MATERIAL:	R\$ 118,09
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 83,98
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 468,48

12748 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12380 MOTORISTA	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 20,8600	R\$ 17,7936
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,7936

VALOR:	R\$ 17,79
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 5,82
VALOR ENCARGOS (114,18%):	R\$ 11,97
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 17,79
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 17,79
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 17,79
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 3,89
VALOR COM BDI:	R\$ 21,68
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 3,66
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 20,38

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 32,4500	R\$ 27,6799
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,6799

VALOR:	R\$ 27,68
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,43
VALOR ENCARGOS (114,18%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,68

(Handwritten signature and initials)



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
LOCAL:	TAMBORIL-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

DATA:	14/08/2024	BDI:	21,84%
FONTE:	SEINFRA	VERBA:	PRÓPRIA
SEINFRA:	PRÓPRIA	IMPOSTO:	0,00%
PRÓPRIA:	PRÓPRIA	DEBÍTO:	0,00%



VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,68
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,73
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11,32
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 63,08

I2755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2550 OPERADOR DE CARREGADEIRA	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 32,4500	R\$ 27,6799
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,6799


VALOR:	R\$ 27,68
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,43
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,68
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,68
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,73
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6,78
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 37,78


I2821 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2580 OPERADOR DE MOTONIVELADORA	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 37,0700	R\$ 31,6207
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 31,6207

VALOR:	R\$ 31,62
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 12,27
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 19,35
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 31,62
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 31,62
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 31,62
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00

[Handwritten signature]

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA:	PRÓPRIA	HORA:	14:00
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE			PREÇO:	21,30

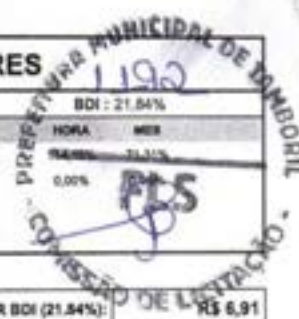

VALOR BDI (21,84%):	R\$ 6,91
VALOR COM BDI:	R\$ 38,53
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 9,12
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 50,86

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12523 OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 23,7100	R\$ 20,2246
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,2246


VALOR:	R\$ 20,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,95
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 20,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 4,42
VALOR COM BDI:	R\$ 24,64
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 38,49
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 214,61

12762 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 32,4500	R\$ 27,6799
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,6799

VALOR:	R\$ 27,68
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,43
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,68
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,68
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,73
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 257,80
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 1.437,24

Handwritten signature and initials.

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE			
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024	BDE:	21,84%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA	SEINFRA
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	PRÓPRIA	PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE						

12770 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP) (H)					
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	0,85300000	R\$ 23,7100	R\$ 20,2246
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,2246


VALOR:	R\$ 20,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,95
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 20,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 4,42
VALOR COM BDI:	R\$ 24,64
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 941,59
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5.249,06

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)					
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,85300000	R\$ 23,7100	R\$ 20,2246
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,2246

VALOR:	R\$ 20,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,95
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 20,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 4,42
VALOR COM BDI:	R\$ 24,64
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 12,82
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 71,46

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)					
Mão de Obra	DESCR. MÃO DE OBRA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,85300000	R\$ 32,4500	R\$ 27,6799
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,6799

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
LOCAL:	TAMBORIL-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE
DATA : 14/08/2024 BDI : 21,84% FONTE VERSÃO HORA MEX SEINFRA 028 SEM DESONERAC 11,044 71,31% PRÓPRIA PRÓPRIA 0,30% 0,50%	

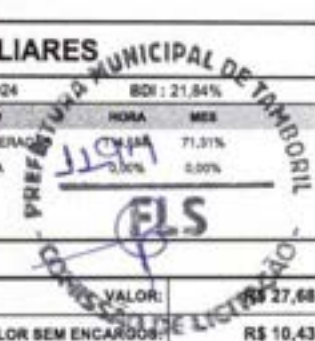

VALOR:	R\$ 27,68
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,43
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,68
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,68
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,73
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 11,32
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 63,08

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 23,7100	R\$ 20,2246
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,2246

VALOR:	R\$ 20,22
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 6,95
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 20,22
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 20,22
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 4,42
VALOR COM BDI:	R\$ 24,64
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 8,27
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 46,08

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (H)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12562 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	SEINFRA	H	0,85300000	R\$ 32,4500	R\$ 27,6799
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 27,6799

VALOR:	R\$ 27,68
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 10,43
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 27,68
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 27,68

Handwritten signature and initials.



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
1195
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
LOCAL:	TAMBORIL-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

DATA:	14/08/2024	BDI:	21,84%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SEINFRA	SEM DEBONERAÇÃO	11,415%	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	

VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,88
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 0,00
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 6,05
VALOR COM BDI:	R\$ 33,73
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 6,78
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 37,78

10758 NÍVEL (CHP) (H)

Genl		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	0,57680000	R\$ 1,0000	R\$ 0,5768
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,23790000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2379
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,36050000	R\$ 1,0000	R\$ 0,3605
TOTAL Genl:						R\$ 1,1752

VALOR:	R\$ 1,18
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 1,18
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 1,18
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 1,18
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 1,18
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 0,26
VALOR COM BDI:	R\$ 1,44
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,49
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2,71

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI) (H)

Genl		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
TOTAL Genl:						R\$ 23,1447

VALOR:	R\$ 23,14
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 9,88
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,26
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 23,14
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 23,14
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,21

Amul

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1196				
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/05/2024	BDI:
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEINFRA	128 SEM DESONERACAO	114,15%	12,84%	0,00%
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE					



VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 2,93
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 5,05
VALOR COM BDI:	R\$ 28,19
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,00
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 0,00

I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)						
		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 20,2200	R\$ 20,2200
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
I2702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000	R\$ 1,3927
TOTAL Geral:						R\$ 24,5374

VALOR:	R\$ 24,54
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 11,27
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 13,27
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 24,54
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 24,54
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 20,22
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 4,32
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 5,36
VALOR COM BDI:	R\$ 29,90
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 46,69
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 260,43

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 43,9800	R\$ 0,0000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 123,8500	R\$ 7,2853
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 23,1400	R\$ 0,0000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,17647059	R\$ 24,5400	R\$ 4,3306
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 11,6159

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0880	CORDEL DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 5,1300	R\$ 6,3612
I2507	DINAMITE 60%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 15,9300	R\$ 0,7965
I2568	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,54000000	R\$ 13,7000	R\$ 7,3980
I2326	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 6,3100	R\$ 0,0568

Handwritten signature and initials



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024	BDI: 21,84%												
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>FUNTE</th> <th>VERBA</th> <th>HORA</th> <th>MIN</th> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028 SEM DEGRADAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,30%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	FUNTE	VERBA	HORA	MIN	SEINFRA	028 SEM DEGRADAÇÃO	114,15%	71,30%	PRÓPRIA	PRÓPRIA			
FUNTE	VERBA	HORA	MIN												
SEINFRA	028 SEM DEGRADAÇÃO	114,15%	71,30%												
PRÓPRIA	PRÓPRIA														
LOCAL:	TAMBORIL-CE														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
02329	ESTOPIM	M	0,06000000	R\$ 6,1800	R\$ 0,3708
02535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,00050000	R\$ 621,9000	R\$ 0,3110
TOTAL Material:					R\$ 15,2943

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
02221	BLASTER	H	0,05017647	R\$ 26,7300	R\$ 1,3412
02543	SERVENTE	H	0,50176470	R\$ 20,2600	R\$ 10,1658
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,5070


VALOR:	R\$ 38,42
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 27,30
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 11,12
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 38,42
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 38,42
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 16,27
VALOR MATERIAL:	R\$ 18,83
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 3,32
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 8,39
VALOR COM BDI:	R\$ 46,81
TOTAL MATERIAL:	R\$ 929,07
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 413,97
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 2.309,61

10775 TEODOLITO (CHP) (H)

Item	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
12701	DEPRECIÇÃO	H	1,13880000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1388
12702	JUROS	H	0,46970000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4697
12703	MANUTENÇÃO	H	0,71170000	R\$ 1,0000	R\$ 0,7117
TOTAL Geral:					R\$ 2,3202

VALOR:	R\$ 2,32
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 2,32
VALOR ENCARGOS:	R\$ 0,00
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 2,32
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 2,32
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 0,00
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 2,32
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 0,51
VALOR COM BDI:	R\$ 2,83
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,96
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 5,32

Handwritten signature and initials.

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
		OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	028 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PROPRIA:	PROPRIA	HORA:	114,15%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE			MES:	21,31%
					0,00%



I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI) (H)

Genl		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,6800	R\$ 27,6800
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
TOTAL Genl:						R\$ 92,0630


VALOR:	R\$ 92,06
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 74,82
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,24
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 92,06
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 92,06
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 64,38
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 20,11
VALOR COM BDI:	R\$ 112,17
TOTAL MATERIAL:	R\$ 0,00
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 0,61
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 3,37

I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) (H)

Genl		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 27,6800	R\$ 27,6800
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 99,0500	R\$ 99,0500
I2701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
I2702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
I2703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	68,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 68,3714
TOTAL Genl:						R\$ 259,4844

VALOR:	R\$ 259,48
VALOR SEM ENCARGOS:	R\$ 242,23
VALOR ENCARGOS (114,15%):	R\$ 17,25
VALOR COM ENCARGOS:	R\$ 259,48
VALOR UNITÁRIO:	R\$ 259,48
VALOR MÃO DE OBRA:	R\$ 27,68
VALOR MATERIAL:	R\$ 99,05
VALOR EQUIPAMENTOS:	R\$ 0,00
VALOR OUTROS:	R\$ 132,75
VALOR BDI (21,84%):	R\$ 56,67
VALOR COM BDI:	R\$ 316,15
TOTAL MATERIAL:	R\$ 107,96
VALOR BDI TOTAL:	R\$ 61,77

Handwritten signature and initials.

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA : 14/08/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEM-FRA</td> <td>028 SEM DEGRADAMENTO</td> <td>114,15%</td> <td>114,15%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	VALOR	SEM-FRA	028 SEM DEGRADAMENTO	114,15%	114,15%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	VALOR											
	SEM-FRA	028 SEM DEGRADAMENTO	114,15%	114,15%											
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
LOCAL:	TAMBORIL-CE	BDI : 21,54%													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														

VALOR TOTAL COM BDI:	R\$ 344,60
----------------------	------------


DAVID
CONSTRUCOES
S
 LTDA:5271708
 8000160

Assinado de forma
 digital por DAVID
 CONSTRUCOES
 LTDA:527170880001
 60
 Dados: 2024.09.12
 15:03:14 -03'00'

WANDES
N PAULINO
DA
 SILVA:0616
 6498357

Assinado de forma
 digital por
 WANDES
 N PAULINO DA
 SILVA:06166498357
 Dados: 2024.09.12
 15:02:57 -03'00'


Amo

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/05/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>OBRA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>028 SEM DEBOERAÇÃO</td> <td>24.1%</td> <td>71.3%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0.0%</td> <td>0.0%</td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	OBRA	MES	SEMPRA	028 SEM DEBOERAÇÃO	24.1%	71.3%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.0%	0.0%
	FORTE	VERSÃO	OBRA	MES											
	SEMPRA	028 SEM DEBOERAÇÃO	24.1%	71.3%											
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0.0%	0.0%												
LOCAL:	TAMBORIL-CE														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,03126980	49,3437444 0
						TOTAL: 49,3437444 0
[I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,03400000	53,6520000 0
						TOTAL: 53,6520000 0
[C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,02842400	44,8530720 0
						TOTAL: 44,8530720 0
[C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,25000000	394,5000000 00
						TOTAL: 394,5000000 00
[I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	2,00000000	0,94000000
						TOTAL: 0,94000000
[I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00045005	0,71017364 0
						TOTAL: 0,71017364
[I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00073429	1,15870436 0
						TOTAL: 1,15870436
[I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00000278	0,00438992 0
						TOTAL: 0,00438992
[I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00070972	1,11993234 0
						TOTAL: 1,11993234
[I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H			

Amk

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SENFRA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,18%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SENFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SENFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,18%	71,31%											
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
LOCAL:	TAMBORIL-CE														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORFICIENTE DO SERVIÇO	QUANTIDADE TOTAL
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,6 0	0,05000000	213,030000 00 213,030000 TOTAL: 00
[10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,6 0	0,01000000	42,6060000 0 42,6060000 TOTAL: 0
[10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00183920	2,90225760 0 2,90225760 TOTAL: 2,90225760
[C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,03400000	53,6520000 0 53,6520000 TOTAL: 0
[10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00118433	1,86887800 0 1,86887800 TOTAL: 1,86887800
[C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,03700000	58,3860000 0 58,3860000 TOTAL: 0
[C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,01500000	23,6700000 0 23,6700000 TOTAL: 0
[10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00118433	1,86887800 0 1,86887800 TOTAL: 1,86887800
[GERAL]	12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,03400000	53,6520000 0 53,6520000 TOTAL: 0

		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024	BDI:	21,84%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	VERBA	HORA:	114,15%
LOCAL:	TAMBORIL-CE	SENTRA:	S28 SEM DESONERAÇÃO	MEB:	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PROPRIA:	PROPRIA		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
[GERAL]	I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	2,00000000	0,94000000
						TOTAL: 0,94000000
[GERAL]	I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00118433	1,86887800
						TOTAL: 1,86887800
[GERAL]	I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00071250	1,12432226
						TOTAL: 1,12432226
[GERAL]	I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H			
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		4.734,0 0	0,00027778	1,31500000
						TOTAL: 1,31500000
[GERAL]	I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00551760	8,70677280
						TOTAL: 8,70677280
[GERAL]	I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,6 0	0,01000000	42,60600000
						TOTAL: 42,60600000
[GERAL]	I2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	H			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,6 0	0,05000000	213,03000000
						TOTAL: 213,03000000
[GERAL]	I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00183920	2,90225760
						TOTAL: 2,90225760
[GERAL]	I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00118433	1,86887800

Amulo

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
203

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS			
	OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024	DE BDI: 21,84%
	DESCRIÇÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FORTE: VERBAO	ROCA: 114,25%
	LOCAL: TAMBORIL-CE	SEINFRA: 028 SEM DESONERAÇÃO	MEX: 71,34%
	CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PRÓPRIA: PRÓPRIA	E.O.M: 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 1,86887800

[GERAL] I2792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA H

C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,00	0	0,00118433	1,86887800
-------	---	----------	---	------------	------------

TOTAL: 1,86887800

[GERAL] I2842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP) H

C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,00	0	0,00071250	1,12432226
-------	---	----------	---	------------	------------

TOTAL: 1,12432226

[GERAL] I2715 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL H

C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,00	0	0,03400000	53,65200000
-------	---	----------	---	------------	-------------

TOTAL: 53,65200000

[GERAL] I2747 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO H

C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	0,47	2,00000000	0,94000000	0,94000000
-------	---	------	------------	------------	------------

TOTAL: 0,94000000

[GERAL] I2752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) H

C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,00	0	0,00073429	1,15870436
-------	---	----------	---	------------	------------

TOTAL: 1,15870436

[GERAL] I2754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) H

C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,00	0	0,00070972	1,11993234
-------	---	----------	---	------------	------------

TOTAL: 1,11993234

[GERAL] I2820 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA H

C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	4.734,00	0	0,00027778	1,31500000
-------	--	----------	---	------------	------------

TOTAL: 1,31500000

[GERAL] I2761 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR. H


C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	4.260,60	0	0,01000000	42,60600000
-------	--	----------	---	------------	-------------

TOTAL: 42,60600000

[GERAL] I2769 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP) H

C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/	4.260,60	0,05000000	213,030000	213,030000
-------	--------------------------------	----------	------------	------------	------------

[Handwritten signatures]


DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEMPRA</td> <td>028 SEM DESOBERAÇÃO</td> <td>14,10%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SEMPRA	028 SEM DESOBERAÇÃO	14,10%	71,31%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEMPRA	028 SEM DESOBERAÇÃO	14,10%	71,31%											
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%													
LOCAL:	TAMBORIL-CE														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C2896	REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		0		00
TOTAL:						213,030000
[GERAL]	I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00183920	2,90225760
TOTAL:						2,90225760
[GERAL]	I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00118433	1,86887800
TOTAL:						1,86887800
[GERAL]	I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00069078	1,09005578
TOTAL:						1,09005578
[I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H			
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		4.734,0 0	0,00027778	1,31500000
TOTAL:						1,31500000
[I0758	NÍVEL (CHP)	H			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	4,00000000	1,88000000
TOTAL:						1,88000000
[I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00551760	8,70677280
TOTAL:						8,70677280
[C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,03126640	49,33837920
TOTAL:						49,33837920
[I0775	TEODOLITO (CHP)	H			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	4,00000000	1,88000000
TOTAL:						1,88000000
[I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00002172	0,03426649

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60

Handwritten signature and initials

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	BDI: 21,84%												
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>ORÇ</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SERVIA</td> <td>028 SEM DESONERACÃO</td> <td>114,15%</td> <td>11,11%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,01%</td> <td></td> </tr> </table>	ORÇ	VERSÃO	HORA	MES	SERVIA	028 SEM DESONERACÃO	114,15%	11,11%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,01%	
	ORÇ	VERSÃO	HORA	MES											
SERVIA	028 SEM DESONERACÃO	114,15%	11,11%												
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,01%													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
------	--------	-----------	------	-----------------------	-----------------------	------------------

TOTAL: 0,03426649

[I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP) H

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 1.578,0 0,00069078 1,09005578 0

TOTAL: 1,09005578

[MÃO DE I0037 AJUDANTE H

C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) 0,47 3,41200000 1,60364000

TOTAL: 1,60364000

[I0109 AREIA MEDIA M3

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 23,67 0,77800000 18,4152600 0

TOTAL: 18,4152600 0

[I0111 AREIA VERMELHA M3

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 4.260,6 0,15000000 639,090000 0

TOTAL: 639,090000 00

[MÃO DE I0221 BLASTER H

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 1.578,0 0,00156884 2,47562570 0

TOTAL: 2,47562570

[I0280 BRITA M3

C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL 23,67 0,96580000 22,8604860 0

TOTAL: 22,8604860 0

[MÃO DE I0445 CALCETEIRO H

C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) 4.260,6 0,25590000 1.090,28754 0

TOTAL: 1.090,28754 000

[I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM M2

C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA 12,00 1,02000000 12,2400000 0


TOTAL: 12,2400000 0

[I0805 CIMENTO PORTLAND KG

C0365 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL 1.578,0 8,63600000 13.627,6080 0

TOTAL: 13.627,6080 0000

Handwritten signature and initials

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	BDI: 21,84%												
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SENTRA</td> <td>028 SEM DESONERACAO</td> <td>13,13%</td> <td>13,13%</td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	SENTRA	028 SEM DESONERACAO	13,13%	13,13%	PROPRIA	PROPRIA	0,00%	
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES											
SENTRA	028 SEM DESONERACAO	13,13%	13,13%												
PROPRIA	PROPRIA	0,00%													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE DO MATERIAL
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		23,67	220,000000	5.207,40000 00 000 TOTAL: 18.835,0080 0000
[I0860	CORDEL DETONANTE	M			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,03877034	61,1795902 1 TOTAL: 61,1795902 1
[GERAL]	I2701	DEPRECIÇÃO	H			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	16,8292000	7,90972400 0
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		4.734,0 0	0,01801175	85,2676245 0
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,6 0	0,28835200	1.228,55253 120
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,47407731	748,093998 22 TOTAL: 2.069,82387 792
[I2507	DINAMITE 60%	KG			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00156332	2,46691896 TOTAL: 2,46691896
[I2568	DINAMITE GRANULADA	KG			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,01688386	26,6427247 7 TOTAL: 26,6427247 7
[MÃO DE	I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS			
	COM-45708314	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		100,00	0,00436054	0,43605400 TOTAL: 0,43605400
[I1100	ESMALTE SINTETICO	L			
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		12,00	1,00000000	12,0000000 0 TOTAL: 12,0000000 0
[I2326	ESPOLETA	UN			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00028140	0,44404541 TOTAL: 0,44404541
[I2329	ESTOPIM	M			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	BOI: 21,84												
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MEB</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEMPRE</td> <td>S28 SEM DESONERACAO</td> <td>74,15%</td> <td>71,91%</td> </tr> <tr> <td>PROPRIA</td> <td>PROPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MEB	SEMPRE	S28 SEM DESONERACAO	74,15%	71,91%	PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%
	PONTE	VERSÃO	HORA	MEB											
SEMPRE	S28 SEM DESONERACAO	74,15%	71,91%												
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,00	0,00187599	2,96030275
				0		TOTAL: 2,96030275
[I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,00	1,00000000	1.578,00000
				0		000
						TOTAL: 1.578,00000
[I2707	GASOLINA	L			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	19,44000000	9,13680000
						0
						TOTAL: 9,13680000
[GERAL]	I2702	JUROS	H			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	5,44680000	2,55999600
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		4.734,00	0,00675442	31,9754085
				0		0
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,60	0,08841600	376,705209
				0		60
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,00	0,15246179	240,584705
				0		97
						TOTAL: 651,825320
						07
[GERAL]	I2703	MANUTENÇÃO	H			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	14,25560000	6,70013200
						0
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		4.734,00	0,02251469	106,584563
				0		50
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,60	0,30640200	1.305,45636
				0		120
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,00	0,56481158	891,272676
				0		79
						TOTAL: 2.310,01373
						349
[MÃO DE]	I2380	MOTORISTA	H			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	1,70600000	0,80182000
						TOTAL: 0,80182000
[MÃO DE]	I2382	NIVELADOR	H			
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)		0,47	3,41200000	1,60364000
						TOTAL: 1,60364000
[I2706	OLEO DIESEL	L			
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		4.734,00	0,00583333	27,6150000

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60

[Handwritten signature]

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	BDI: 21,64%												
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>PONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEM-FRA</td> <td>028 SEM DISONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	PONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEM-FRA	028 SEM DISONERAÇÃO	114,15%		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	
	PONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SEM-FRA	028 SEM DISONERAÇÃO	114,15%													
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%													
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DO INSUMO	QUANTIDADE TOTAL
C3232		RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		0		0
C2896		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,6	0,09600000	409,017600
				0		00
C0365		BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0	0,14360864	226,614435
				0		70
TOTAL:						663,247035
						70

[MÃO DE 12548 OPERADOR DE BETONEIRA		H
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,0
		0
TOTAL:		45,7651560
		0

[MÃO DE 12550 OPERADOR DE CARREGADEIRA		H
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,0
		0
TOTAL:		2,55319983
		0

[MÃO DE 12551 OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO		H
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	4.260,6
		0
TOTAL:		36,3429180
		0

[MÃO DE 12552 OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA		H
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	4.260,6
		0
TOTAL:		181,714590
		00

[MÃO DE 12553 OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR		H
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,0
		0
TOTAL:		2,47562573
		0

[MÃO DE 12554 OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM		H
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,0
		0
TOTAL:		1,59415293
		0

[MÃO DE 12555 OPERADOR DE GRUPO GERADOR		H
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	1.578,0
		0
TOTAL:		1,59415293
		0

[MÃO DE 12560 OPERADOR DE MOTONIVELADORA		H
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA	4.734,0
		0
TOTAL:		1,12169500
		0

Handwritten signature and initials.

DC David Construções		DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS		MUNICIPAL DE TAMBORIL	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/06/2024	BDI:	21,84
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE:	VERBA	HORA:	MES
LOCAL:	TAMBORIL-CE	SENTRA:	GR SEM DEDUÇÃO	134,15%	71,31%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PRÓPRIA:	PRÓPRIA		0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	COEFICIENTE DOMÍNIO	QUANTIDADE TOTAL
[MÃO DE I2523		OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00470651	7,42687720
						TOTAL: 7,42687720
[MÃO DE I2562		OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00060776	0,95904689
						TOTAL: 0,95904689
[I2528		PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00001137	0,01794123
						TOTAL: 0,01794123
[I1600		PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3			
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,6 0	0,15000000	639,090000 00
						TOTAL: 639,090000 00
[MÃO DE I2391		PEDREIRO	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,12795000	201,905100 00
						TOTAL: 201,905100 00
[MÃO DE I2395		PINTOR	H			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,04265000	67,3017000 0
						TOTAL: 67,3017000 0
[I1691		PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M			
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		12,00	4,50000000	54,0000000 0
						TOTAL: 54,0000000 0
[I1725		PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG			
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		12,00	0,15000000	1,80000000
						TOTAL: 1,80000000
[I2535		SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG			
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,0 0	0,00001563	0,02466919
						TOTAL: 0,02466919
[MÃO DE I2543		SERVENTE	H			

DETALHAMENTO DOS QUANTITATIVOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024 BDI: 21,84%												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SEM FRA</td> <td>SEM DESONERACAO</td> <td>04499</td> <td>24345</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td></td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SEM FRA	SEM DESONERACAO	04499	24345	PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
	SEM FRA	SEM DESONERACAO	04499	24345											
PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%												
LOCAL:	TAMBORIL-CE														
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE DO SERVIÇO	CORRENTES DO VALOR	QUANTIDADE TOTAL
	C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA		4.734,00	0,00047389	2,24339526
	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		12,00	1,70600000	20,47200000
	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)		4.260,60	0,51180000	2.180,575080
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL		1.578,00	0,44312383	699,24940267
	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M		23,67	2,49929000	59,15819430
	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL		23,67	8,53000000	201,90510000
	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		4.734,00	0,06397500	302,85765000
					TOTAL:	3.466,46082
						223

[I2496 SUPERCAL		KG
	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL
		1.578,00 0,07500000 118,35000000
		TOTAL: 118,35000000

[MÃO DE I2445 TOPOGRAFO		H
	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)
		0,47 4,26500000 2,00455000
		TOTAL: 2,00455000

DAVID
CONSTRUCO
ES
LTDA:527170
88000160


Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUCOES LTDA:5271708800 0160 Dados: 2024.09.12 15:03:37 -03'00'

WANDESON
PAULINO DA
SILVA:06166
498357

Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357 Dados: 2024.09.12 15:03:53 -03'00'

(Handwritten signature)

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

		DATA : 14/08/2024 BDI : 21,84%	
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE		
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE		
LOCAL:	TAMBORIL-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)				4.260,60	R\$ 52,48	R\$ 223.596,29			B
C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL				1.578,00	R\$ 31,93	R\$ 50.385,54			C
C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL				23,67	R\$ 542,53	R\$ 12.841,69			C
COM-	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				100,00	R\$ 106,26	R\$ 10.626,00			C
4570831										
4										
C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA				4.734,00	R\$ 1,58	R\$ 7.479,72			C
C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA				12,00	R\$ 194,33	R\$ 2.331,96			C
C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M				23,67	R\$ 61,70	R\$ 1.460,44			C
C3232	RECONFORMAÇÃO/PATROLAGEM DA PLATAFORMA				4.734,00	R\$ 0,11	R\$ 520,74			C
C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)				0,47	R\$ 586,39	R\$ 275,60			C

Subtotal até 100,00% R\$ 309.517,98
 Outros R\$ 0,00
 Valor total do Orçamento R\$ 309.517,98

David
David


DAVID
 CONSTRUÇÕES
 LTDA-5271708
 8000160
Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUÇÕES LTDA-52717080001
 Data: 2024.09.12 15:06:12 -03'00'

WANDESON
 PAULINO DA
 SILVA:0616664
 98357
Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:0616666357
 Data: 2024.09.12 15:04:33 -03'00'



DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

	ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS	BDI : 21,84%
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	VERBAO
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	SEM SEM DESONERACAO
LOCAL:	TAMBORIL-CE	PROFIMA
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PROFIMA
DATA :	14/08/2024	DATA :
		DATA :

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
I2543	SERVENTE				3.466,46	R\$ 20,26	R\$ 70.230,50			A
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)				639,09	R\$ 96,60	R\$ 61.736,09			A
I0111	AREIA VERMELHA				639,09	R\$ 59,71	R\$ 38.160,06			B
I0445	CALCETEIRO				1.090,29	R\$ 26,86	R\$ 29.285,12			B
I0805	CIMENTO PORTLAND				18.835,01	R\$ 0,61	R\$ 11.489,35			B
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR				0,436054	R\$ 19.999,74	R\$ 8.720,97			B
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)				1.578,00	R\$ 3,74	R\$ 5.901,72			B
I2391	PEDREIRO				201,91	R\$ 26,86	R\$ 5.423,17			B
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA				181,71	R\$ 23,71	R\$ 4.308,45			B
I2706	OLEO DIESEL				663,25	R\$ 4,26	R\$ 2.825,43			B
I2703	MANUTENÇÃO				2.310,01	R\$ 1,00	R\$ 2.310,01			B
I2701	DEPRECIAÇÃO				2.069,82	R\$ 1,00	R\$ 2.069,82			B
I0280	BRITA				22,86	R\$ 85,73	R\$ 1.959,83			B
I2395	PINTOR				67,30	R\$ 26,86	R\$ 1.807,72			B
I0109	AREIA MEDIA				18,42	R\$ 71,29	R\$ 1.312,82			B
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO				36,34	R\$ 32,45	R\$ 1.179,33			C
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA				45,77	R\$ 23,71	R\$ 1.085,09			C
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"				54,00	R\$ 13,72	R\$ 740,88			C
I2702	JUROS				651,83	R\$ 1,00	R\$ 651,83			C
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM				12,24	R\$ 33,29	R\$ 407,47			C
I2528	PEÇAS DE DESGASTE-DO BRITADOR				0,01794122	R\$ 22.675,30	R\$ 406,82			C
					88					
I2568	DINAMITE GRANULADA				26,64	R\$ 13,70	R\$ 365,01			C
I1100	ESMALTE SINTETICO				12,00	R\$ 27,19	R\$ 326,28			C
I0860	CORDEL DETONANTE				61,18	R\$ 5,13	R\$ 313,85			C
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO				7,43	R\$ 23,71	R\$ 176,09			C
I2496	SUPERCAL				118,35	R\$ 1,25	R\$ 147,94			C



David

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
 DATA: 14/08/2024 BDI: 21,84%
 FONTE: VERBA ORÇAMENTARIA
 DESCRICÃO: PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
 LOCAL: TAMBORIL-CE
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

FORTE: SEM DESONERACAO
 PRECO UNITARIO: 114,18% 71,37%
 UNIDADE: 0,00% 0,00%

CÓDIGO	DESCRICÃO	QUANTIDADE	UNIDADE	TIPO	FORTE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. N	CL
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	2,55				R\$ 32,45	R\$ 82,85			C
I2445	TOPOGRAFO	2,00				R\$ 35,60	R\$ 71,36			C
I0221	BLASTER	2,48				R\$ 26,73	R\$ 66,17			C
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	2,48				R\$ 23,71	R\$ 58,70			C
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	1,59				R\$ 32,45	R\$ 51,73			C
I2382	NIVELADOR	1,60				R\$ 29,64	R\$ 47,53			C
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	1,12				R\$ 37,07	R\$ 41,58			C
I2707	GASOLINA	9,14				R\$ 4,33	R\$ 39,56			C
I2507	DINAMITE 60%	2,47				R\$ 15,93	R\$ 39,30			C
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	1,59				R\$ 23,71	R\$ 37,80			C
I0037	AJUDANTE	1,60				R\$ 21,10	R\$ 33,84			C
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	0,95904689 1649494855 73058016				R\$ 32,45	R\$ 31,12			C
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	1,80				R\$ 13,64	R\$ 24,55			C
I2329	ESTOPIM	2,96				R\$ 6,18	R\$ 18,29			C
I2380	MOTORISTA	0,80182				R\$ 20,86	R\$ 16,73			C
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	0,02466918 96				R\$ 621,90	R\$ 15,34			C
I2326	ESPOLETA	0,44404541 28				R\$ 6,31	R\$ 2,80			C

Subtotal até 82,07% R\$ 254.020,90

Outros R\$ 55.497,08


Valor total do Orçamento R\$ 309.517,98

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUCOES LTDA-5271708800
 Assinado de forma digital por WANDERSON PAULINO DA SILVA-06166498357
 Dados: 2024.09.12 15:04:54 -03'00'

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUCOES LTDA-5271708800
 Assinado de forma digital por WANDERSON PAULINO DA SILVA-06166498357
 Dados: 2024.09.12 15:04:54 -03'00'

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 52.717.088/0001-60



	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/09/2024	BDI: 21,84%												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>FOINTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SENHIA</td> <td>028 SEM DESONERAÇÃO</td> <td>114,15%</td> <td>71,31%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </table>	FOINTE	VERSÃO	HORA	MES	SENHIA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%		
	FOINTE	VERSÃO	HORA	MES												
SENHIA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%													
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%														
LOCAL:	TAMBORIL-CE															
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE															



ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 10.626,00	33,33 % R\$ 3.541,65	33,33 % R\$ 3.541,65	33,34 % R\$ 3.542,70	100,00 % R\$ 10.626,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.128,30	100,00 % R\$ 3.128,30			100,00 % R\$ 3.128,30
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	R\$ 288.283,96	20,00 % R\$ 57.656,79	50,00 % R\$ 144.141,98	30,00 % R\$ 86.485,19	100,00 % R\$ 288.283,96
4	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 7.479,72			100,00 % R\$ 7.479,72	100,00 % R\$ 7.479,72
		R\$ 309.517,98	R\$ 64.326,74	R\$ 147.883,63	R\$ 97.507,61	R\$ 309.517,98
			R\$ 64.326,74	R\$ 212.010,37	R\$ 309.517,98	309.517,98

DAVID
CONSTRUCO
ES
 LTDA:52717
 088000160

Assinado de forma
 digital por DAVID
 CONSTRUCOES
 LTDA:5271708800
 0160
 Dados: 2024.09.12
 15:05:41 -03'00'

WANDESON
PAULINO DA
SILVA:06166
498357

Assinado de forma
 digital por
 WANDESON
 PAULINO DA
 SILVA:06166498357
 Dados: 2024.09.12
 15:06:03 -03'00'

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

	CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS			
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	ORÇAMENTO:	BDI: 21,84%
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	PROTEÇÃO:	114,00% 11,31%
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PROPRIA:	0,00% 0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE
015
LICITAÇÃO Nº 001/2024
PROCESSO Nº 001/2024
EMPRESA: DAVID CONSTRUÇÕES LTDA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS	QTD. MÊS	QTD. MÊS	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	M2	78,90000000	197,2500000	118,3500000	394,5000000
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M	M3	4,73400000	11,83500000	7,10100000	23,67000000
C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	M3	9,86874888	24,67187220	14,80312332	49,34374440
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	M3	11,67720000	29,19300000	17,51580000	58,38600000
C3235	ROCHA PARA BRITAGEM	M3	9,86767584	24,66918960	14,80151376	49,33837920
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	M3	8,97061440	22,42653600	13,45592160	44,85307200
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	10,73040000	26,82600000	16,09560000	53,65200000
I0037	AJUDANTE	H	1,60364000			1,60364000
I0109	AREIA MEDIA	M3	3,68305200	9,20763000	5,52457800	18,41526000
I0111	AREIA VERMELHA	M3	127,8180000	319,5450000	191,7270000	639,0900000
I0221	BLASTER	H	0,49512514	1,23781285	0,74268771	2,47562570
I0280	BRITA	M3	4,57209720	11,43024300	6,85814580	22,86048600
I0445	CALCETEIRO	H	218,0575080	545,1437700	327,0862620	1.090,287540
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	M2	12,24000000			12,24000000
I0566	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI)	H				0,00000000
I0594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)	H	0,14203473	0,35508682	0,21305209	0,71017364
I0596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHI)	H	0,00087798	0,00219496	0,00131698	0,00438992
I0614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)	H				0,00000000
I0618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHI)	H				0,00000000
I0626	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHI)	H				0,00000000
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	H				0,00000000
I0645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)	H				0,00000000
I0666	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)	H	0,00685330	0,01713324	0,01027995	0,03426649
I0680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	H	10,73040000	26,82600000	16,09560000	53,65200000
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	H	0,94000000			0,94000000
I0708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	H	0,23174087	0,57935218	0,34761131	1,15870436
I0710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	H	0,22398647	0,55996617	0,33597970	1,11993234
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	H	42,60600000	106,5150000	63,90900000	213,0300000
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	8,52120000	21,30300000	12,78180000	42,60600000
I0728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	H	0,58045152	1,45112880	0,87067728	2,90225760
I0732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)	H	0,37377560	0,93443900	0,56066340	1,86887800
I0740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	H	0,37377560	0,93443900	0,56066340	1,86887800
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	H	1,31500000			1,31500000
I0758	NÍVEL (CHP)	H	1,88000000			1,88000000
I0759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	H	1,74135456	4,35338640	2,61203184	8,70677280

David

**CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS**

OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE
LOCAL:	TAMBORIL-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE

DATA: 14/08/2024

RFB: 21.86%

FONTE	VERSÃO	QUOTA	RENT
SEINFRA	SEM DESONERAÇÃO	14,15%	71,30%
PRÓPRIA	PRÓPRIA		0,00%

1216

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS	QTD. MÊS	QTD. MÊS	TOTAL
I0775	TEODOLITO (CHP)	H	1,88000000			1,88000000
I0779	TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)	H	0,21801116	0,54502789	0,32701673	1,09005578
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	3.767,001600	9.417,504000	5.650,502400	18.835,00800
I0860	CORDEL DETONANTE	M	12,23591804	30,58979510	18,35387706	61,17959021
I1100	ESMALTE SINTETICO	L	12,00000000			12,00000000
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	M3	127,8180000	319,5450000	191,7270000	639,0900000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"X3"	M	54,00000000			54,00000000
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" X 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	KG	1,80000000			1,80000000
I2326	ESPOLETA	UN	0,08880908	0,22202271	0,13321362	0,44404541
I2329	ESTOPIM	M	0,59206055	1,48015138	0,88809083	2,96030275
I2380	MOTORISTA	H	0,80182000			0,80182000
I2382	NIVELADOR	H	1,60364000			1,60364000
I2391	PEDREIRO	H	40,38102000	100,9525500	60,57153000	201,9051000
I2395	PINTOR	H	13,46034000	33,65085000	20,19051000	67,30170000
I2445	TOPOGRAFO	H	2,00455000			2,00455000
I2496	SUPERCAL	KG	23,67000000	59,17500000	35,50500000	118,3500000
I2507	DINAMITE 60%	KG	0,49338379	1,23345948	0,74007569	2,46691896
I2523	OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR PNEUMATICO	H	1,48537544	3,71343860	2,22806316	7,42687720
I2528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,00358825	0,00897061	0,00538237	0,01794123
I2535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D=22MM	JG	0,00493384	0,01233459	0,00740076	0,02466919
I2543	SERVENTE	H	650,8929506	1.570,443888	1.245,123983	3.466,460822
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	M	315,6000000	789,0000000	473,4000000	1.578,000000
I2548	OPERADOR DE BETONEIRA	H	9,15303120	22,88257800	13,72954680	45,76515600
I2550	OPERADOR DE CARREGADEIRA	H	0,51063997	1,27659991	0,76595995	2,55319983
I2551	OPERADOR DE COMPACTADOR AUTO PROPELIDO	H	7,26858360	18,17145900	10,90287540	36,34291800
I2552	OPERADOR DE COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA	H	36,34291800	90,85729500	54,51437700	181,7145900
I2553	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR	H	0,49512515	1,23781287	0,74268772	2,47562573
I2554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	H	0,31883059	0,79707647	0,47824588	1,59415293
I2555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	H	0,31883059	0,79707647	0,47824588	1,59415293
I2560	OPERADOR DE MOTONIVELADORA	H	1,12169500			1,12169500
I2562	OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRAS	H	0,19180938	0,47952345	0,28771407	0,95904689
I2568	DINAMITE GRANULADA	KG	5,32854495	13,32136238	7,99281743	26,64272477
I2701	DEPRECIAÇÃO	H	488,5066543	988,3232647	592,9939588	2.069,823877
I2702	JUROS	H	157,9933876	308,6449577	185,1869746	651,8253200
I2703	MANUTENÇÃO	H	552,6305031	1.098,364519	659,0187114	2.310,013733
I2706	OLEO DIESEL	L	154,7414071	317,8160178	190,6896107	663,2470357
I2707	GASOLINA	L	9,13680000			9,13680000
I2715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	10,73040000	26,82600000	16,09560000	53,65200000

CRONOGRAMA FÍSICO DE INSUMOS															
	OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024												
	DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	BDI: 21,84%												
	LOCAL:	TAMBORIL-CE	<table border="1"> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> <tr> <td>SENFRA</td> <td>028 SEM DEBONORAÇÃO</td> <td>11,15%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SENFRA	028 SEM DEBONORAÇÃO	11,15%	100%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES											
SENFRA	028 SEM DEBONORAÇÃO	11,15%	100%												
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%												
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE														

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD. MÊS	QTD. MÊS	QTD. MÊS	TOTAL
I2716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	H	10,73040000	26,82600000	16,09560000	53,65200000
I2747	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	0,94000000			0,94000000
I2748	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CAMINHONETE SAVEIRO	H	0,94000000			0,94000000
I2752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	0,23174087	0,57935218	0,34761131	1,15870436
I2753	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP)	H	0,37377560	0,93443900	0,56066340	1,86887800
I2754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,22398647	0,55996617	0,33597970	1,11993234
I2755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	H	0,22486445	0,56216113	0,33729668	1,12432226
I2761	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	8,52120000	21,30300000	12,78180000	42,60600000
I2762	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPAC. LISO TANDEM AUTOPR.	H	8,52120000	21,30300000	12,78180000	42,60600000
I2769	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4HP)	H	42,60600000	106,5150000	63,90900000	213,0300000
I2770	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA (4 HP)	H	42,60600000	106,5150000	63,90900000	213,0300000
I2775	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	0,58045152	1,45112880	0,87067728	2,90225760
I2776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	H	0,58045152	1,45112880	0,87067728	2,90225760
I2781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	H	0,37377560	0,93443900	0,56066340	1,86887800
I2791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	0,37377560	0,93443900	0,56066340	1,86887800
I2792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	H	0,37377560	0,93443900	0,56066340	1,86887800
I2820	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,31500000			1,31500000
I2821	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA MOTO NIVELADORA	H	1,31500000			1,31500000
I2823	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	H	1,74135456	4,35338640	2,61203184	8,70677280
I2841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	0,21801116	0,54502789	0,32701673	1,09005578
I2842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	H	0,22486445	0,56216113	0,33729668	1,12432226
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	MÊS	0,14533680	0,14533680	0,14538040	0,43605400

DAVID
CONSTRUCOES
S
LTDA:527170
88000160

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUCOES LTDA:52717088000160
Dados: 2024.09.12 15:06:25 -03'00'

WANDESON
PAULINO DA
SILVA:061664
98357

Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357
Dados: 2024.09.12 15:06:48 -03'00'

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA:	14/08/2024
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	VERSIÃO:	BDI - 21,84%
LOCAL:	TAMBORIL-CE	SEMPRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	%
DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,10%
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,11%
R	RISCOS	0,60%
TOTAL		5,81%

BENEFÍCIOS		
S + G	GARANTIA/SEGUROS	0,50%
L	LUCRO	7,50%
TOTAL		8,00%

IMPOSTOS		
I	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	2,50%
	CPRB	0,00%
TOTAL		6,15%

BDI = 21,84%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

DAVID
CONSTRUCOES
S
LTDA:527170
88000160

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUCOES LTDA:52717088000 160
Dados: 2024.09.12 15:07:15 -03'00'

WANDESON
PAULINO DA
SILVA:06166
498357

Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357
Dados: 2024.09.12 15:07:31 -03'00'

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	DATA: 14/08/2024	BDI: 21,84%
DESCRIÇÃO:	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE	FONTE	VERSÃO
LOCAL:	TAMBORIL-CE	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL-CE	PRÓPRIA	PRÓPRIA
		HORA	MES
		114,15%	0,00%



COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
	INSS	20,00%	20,00%
	SESI	1,50%	1,50%
	SENAI	1,00%	1,00%
	INCRA	0,20%	0,20%
	SEBRAE	0,60%	0,60%
	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%
	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%
	FGTS	8,00%	8,00%
	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%

B	GRUPO B		
	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,85%	0,00%
	FERIADOS	3,71%	0,00%
	AUXÍLIO - ENFERMIDADE	0,87%	0,66%
	13º SALÁRIO	11,03%	8,33%
	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%
	FALTAS JUSTIFICADAS	0,74%	0,56%
	DIAS DE CHUVAS	1,59%	0,00%
	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,11%	0,08%
	FÉRIAS GOZADAS	12,35%	9,33%
	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,52%	4,17%
	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%	0,10%
	FÉRIAS INDENIZADAS	1,72%	1,30%
	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,87%	2,17%
	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	17,80%	7,01%
	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,49%	0,37%
	TOTAL	18,29%	7,38%

A + B + C + D = 114,15% 71,31%

DAVID
CONSTRUCOES
LTDA:52717
088000160

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUÇÕES LTDA:5271708800 0160
Dados: 2024.09.12 15:07:49 -03'00'

WANDESON PAULINO DA SILVA:0616 6498357

Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:0616649835 7
Dados: 2024.09.12 15:08:07 -03'00'

APÓLICE DIGITAL



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junta Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: 13/08/2024 13:47:53

Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0427698

Proposta: 4713463

Controle Interno (Código Controle): 791542598

Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750427698

DADOS DO SEGURADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBORIL

CPF/CNPJ: 07.705.817/0001-04 RUA GERMINIANO RODRIGUES DE FARIAS, S/N, BAIRRO SÃO PEDRO, TAMBORIL - CE

DADOS DO TOMADOR: DAVID CONSTRUCOES LTDA

CPF/CNPJ: 52.717.088/0001-60 RUA OXALA 25, , PARANGABA - CEP: 60.740-560 - FORTALEZA - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.205171-6 EAV CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

ICP
Brasil
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatário(s): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 62FF8E26A0F88284 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 7ABF101888728D6601532D0F8E57775DCFEADD87

Autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica garantida através de Chaves Públicas Brasileiras-ICP-Brasil. As condições contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade junto à Susep, poderão ser consultadas no site <https://www.gov.br/susep/pt-br> de acordo com o número de processo constante da apólice / proposta. A certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP pode ser consultada no site <https://www.gov.br/susep/pt-br>. Este produto está protocolado através do N.º de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e nº 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484. Central de Atendimento: 0800.704.0301, deficiente auditivo 0800.742.8060, Ouvidoria: 0800.643.0301, <http://www.consumidor.gov.br>.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0427698
 Proposta: 4713463
 Controle Interno (Código Controle): 791542598
 Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750427698



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 3.638,14	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 3.638,14	14/08/2024	13/01/2025
Multas e Penalidades	R\$ 3.638,14	14/08/2024	13/01/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	03/09/2024	22455792	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, dedução do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), à(s) parte(s) devida(s) no âmbito desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratado(s) isoladamente ou em outra composição.

Amuk
 APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0427698
Proposta: 4713463
Controle Interno (Código Controle): 791542598
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750427698



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº 002/2024/ CP**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0427698
Proposta: 4713463
Controle Interno (Código Controle): 791542598
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750427698



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0427698
Proposta: 4713463
Controle Interno (Código Controle): 791542598
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750427698



3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convenionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao "canal de sinistro" constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro

APÓLICE DIGITAL



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0427698
Proposta: 4713463
Controle Interno (Código Controle): 791542598
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750427698



devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0427698
Proposta: 4713463
Controle Interno (Código Controle): 791542598
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750427698



que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0427698
Proposta: 4713463
Controle Interno (Código Controle): 791542598
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750427698



11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. **Apólice:** documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. **Beneficiário:** pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. **Condições Particulares:** conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. **Edital:** ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das

APÓLICE DIGITAL

4

Amib



Nº Apólice Seguro Garantia: 10-0775-0427698
Proposta: 4713463
Controle Interno (Código Controle): 791542598
Nº de Registro SUSEP: 054362024001007750427698



propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, mandais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.

Amub
APÓLICE DIGITAL



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS



CERTIDÃO DE APOSTAMENTOS

Observado o previsto na Circular Susep nº 691/23, certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ 84.948.157/0001-33, nesta data e horário, possui a seguinte situação em relação aos apontamentos listados a seguir:

01. Patrimônio Líquido Ajustado (PLA) inferior ao Capital Mínimo Requerido (CMR)

NADA CONSTA

02. Montante de ativos garantidores inferior à necessidade de cobertura das provisões técnicas

NADA CONSTA

03. Ajustes nos reportes contábeis e/ou prudenciais exigidos pela Susep e ainda não realizados, considerando o prazo estabelecido pela Autarquia

NADA CONSTA

04. Plano de Regularização de Solvência (PRS) em andamento.

NADA CONSTA

05. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) em andamento

NADA CONSTA

06. Plano de Regularização de Solvência (PRS) descumprido

NADA CONSTA

07. Plano de Regularização de Suficiência de Cobertura (PRC) descumprido

NADA CONSTA

08. Não apresentação ou apresentação incompleta do formulário de informações periódicas (FIP/Susep) ou das demonstrações financeiras na forma da legislação aplicável

NADA CONSTA

09. Processo para Reparação de Apontamentos (PRA) descumprido

NADA CONSTA

10. Indisponibilidade de autorização para movimentar livremente a carteira de títulos e valores mobiliários dados em cobertura de provisões técnicas

NADA CONSTA



11. Medida prudencial preventiva o/ou medida cautelar em vigor descumprida

NADA CONSTA

12. Instauração de Fiscalização Especial, decorrente do previsto no art. 89 do Decreto-Lei nº 73/66

NADA CONSTA

13. Instauração de regime de Direção Fiscal ou de Intervenção

NADA CONSTA

14. Não pagamento da taxa de fiscalização

NADA CONSTA

15. Não encaminhamento da documentação referente a assembleias gerais e nomeações de administradores

NADA CONSTA

A existência de eventuais apontamentos não implica perda da autorização ou impedimento ao funcionamento da supervisionada.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de licenciamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CA-fa1832d3-c98e-4e17-aca7-864b149c9d3f

Esta Certidão foi emitida em 06/08/2024, às 13:29, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDÃO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ nº 84.948.157/0001-33, está autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139, publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NÃO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NÃO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidação, Direção Fiscal ou Intervenção.

O Sistema de Certidões é público e pode ser acessado por meio do site da Susep, no endereço: <https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep>

O Sistema de Certidões abrange, ainda, a certidão de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicação e descrição dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certidões ficará disponível no site da Susep (no mesmo link acima).

Código da certidão para autenticação no site da Susep: CL-047c6fc5-0158-4b5d-9353-4c03fabb4ecc

Esta Certidão foi emitida em 06/08/2024, às 13:28, e é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES

CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES



Certificamos que a JUNTO SEGUROS S.A., com sede na cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
DIEGO MARINS MASSARA	Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA NOBREGA	Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRESTES	Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO	Diretor
LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI	Diretor
ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO	Presidente

Código da Certidão: CA05436_06082024_132419_124
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 06 de Agosto

[Assinaturas manuscritas]



Declarações

A empresa **David Construções Ltda**, inscrita no CNPJ: **52.717.088/0001-60**, com sede na rua: Oxalá, N° 25 - Parangaba - Fortaleza-CE, representada por sr. **Uesley Oliveira David**, RG de n° **2008302511-6 SSPDS-CE** e de CPF de n° **065.485.003-85**, para fins de participação em processo licitatório, **Declaro**, sob as penas da lei e para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório e conforme a lei n° 14.133/2021:

- i- Que por ocasião da contratação, disporá de pessoal técnico especializado, instalações, materiais, aparelhamento de canteiros, máquinas, veículos, e de toda infraestrutura disponível, bem como, que serão utilizados equipamentos em condições de operacionalidade, disponíveis para serem utilizados na execução do objeto licitado e que atendem as demandas e especificações técnicas exigidas para a perfeita prestação dos serviços, tudo para um melhor cumprimento do objeto da licitação, em conformidade a lei n° 14.133/2021.

Nos comprometemos ainda a aplicar na obra somente materiais e equipamentos devidamente homologados e os respectivos fabricantes cadastrados na associação brasileira de normas técnicas - abnt ou órgão similar. E seguir criteriosamente o projeto básico, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Os equipamentos não encontrar-se-ão vinculados a outro contrato, enquanto estiver em vigor o contrato relativo ao objeto desta licitação.

- ii- Caso venhamos a ser o vencedor da obra objeto dessa licitação, este abaixo relacionado irá participar mediante suas capacidades profissionais e técnicas, e a sua substituição só será possível por profissional de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do contrato, ratificada pelo seu superior e pela administração. Em conformidade a lei n° 14.133/2021.

- iii- O sr. **Wanderson Paulino Da Silva**, portador da Carteira Profissional do CREA n° 366847CE, sob Registro: 0621531944, inscrito no CPF sob o n° 061.664.98.-57 e Carteira de Identidade n° 05671060601 CNH, é responsável técnico e Engenheiro Civil da referida empresa.

- iv- **Wanderson Paulino Da Silva**, profissional responsável técnico, engenheiro civil, portador da Carteira Profissional do CREA n° 366847CE, sob Registro: 0621531944, inscrito no CPF sob o n° 061.664.98.-57 e Carteira de Identidade n° 05671060601 CNH, **Declaro, que concordo com a inclusão do meu nome na participação da equipe técnica para participar da execução do objeto da licitação, participando permanentemente, a serviço da proponente, na execução do objeto da licitação em conformidade a lei n° 14.133/2021.**

- v- Que o sr. **Wanderson Paulino Da Silva**, profissional responsável técnico, engenheiro civil, portador da Carteira Profissional do CREA n° 366847CE, sob Registro: 0621531944, inscrito no CPF sob o n° 061.664.98.-57 e Carteira de Identidade n° 05671060601 CNH, junto com esta empresa, recebeu toda documentação necessária para a elaboração da proposta de preços; tomamos conhecimento, e estamos de pleno acordo de todas as informações e das circunstâncias locais para o cumprimento das obrigações, objeto desta licitação estabelecidas no edital e seus anexos, nos termos da lei n° 14.133/2021. Ainda, que temos pleno conhecimento dos projetos, das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos a serem executados. assumindo, incondicionalmente, total responsabilidade por esse fato e informando, que **não** o utilizaremos para quaisquer questionamentos

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60 / RUA: OXALÁ, N° 25 - PARANGABA - FORTALEZA-CE, CEP: 60.740-560 / (85) 988031662 - davidconstrucoes8@gmail.com

Handwritten signature and initials.



futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o órgão licitador, em relação aos serviços que serão executados e dos equipamentos que serão utilizados na realização dos serviços, bem como dos preços que serão praticados. Tendo ciência do local, a região onde serão executados os serviços referenciados, graus de complexidade existentes na área, e de todas as informações e das condições locais que possam influir direta ou indiretamente na execução deles.

Fortaleza-CE, 12 de julho de 2024.

Atenciosamente,

DAVID
CONSTRUCOES
LTDA:5271708
8000160

Assinado de forma digital por DAVID CONSTRUCOES LTDA:52717088000160
Dados: 2024.07.12 08:03:06 -03'00'

UESLEY OLIVEIRA DAVID
RG 2008302511-6 SSPDS-CE
CPF: 065.485.003-85
SÓCIO PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL LEGAL
DAVID CONSTRUÇÕES LTDA

WANDESON
PAULINO DA
SILVA:06166
498357

Assinado de forma digital por WANDESON PAULINO DA SILVA:06166498357
Dados: 2024.07.12 08:03:20 -03'00'

WANDESON PAULINO DA SILVA
CARTEIRA PROFISSIONAL DO CREA Nº 366847CE
CPF Nº 061.664.98-57
ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL

David Construções
LTDA.

(85)988031662

CNPJ: 52.717.088/0001-60

davidconstrucoes8@gmail.com

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60 / RUA: OXALÁ, Nº 25 -
PARANGABA - FORTALEZA-CE, CEP: 60.740-560 / (85) 988031662 -
davidconstrucoes8@gmail.com



Declarações

A empresa **David Construções Ltda**, inscrita no CNPJ: 52.717.088/0001-60, com sede na rua: Oxalá, N° 25 - Parangaba - Fortaleza-CE, representada por sr. **Uesley Oliveira David**, RG de n° 2008302511-6 SSPDS-CE e de CPF de n° 065.485.003-85,

Declaro, sob as penas da lei e para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório e conforme a lei n° 14.133/2021:

- I- Em atendimento ao previsto no edital, que, cumpre plenamente os requisitos da habilitação.
- II- que não executamos trabalho noturno, perigoso ou insalubre com menores de dezoito anos e de qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da constituição federal e de conformidade com a exigência prevista no inciso v, do art. 27 da lei federal n° 8.666/93 e no art. 63 da lei 14.133/2021.
- III- Que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos serviços a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende e concorda integralmente aos requisitos constantes neste edital, inclusive quanto a Elaboração Independente da Proposta de Preços. Tendo ciência sobre a forma de comunicação dos atos deste processo e atendendo plenamente aos requisitos necessários para habilitação. Ainda que, nossa proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- IV- Que conhece, aceita e concorda integralmente com todos os termos deste edital e seus anexos, ainda, que atenderá às exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que está regular perante a fazenda nacional, a seguridade social, FGTS e CNDT.
- V- Sob as penalidades cabíveis, que inexistem qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, não se encontrando em concordata ou estado falimentar, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores. Ressalta, ainda, não estar sofrendo penalidade de declaração de idoneidade no âmbito da administração federal, estadual, municipal ou do distrito federal, arcando civil e criminalmente pela presente afirmação. Bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme a lei n° 14.133/2021.
- VI- Que a licitante não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, conforme a lei n° 14.133/2021.
- VII- Que os serviços são prestados por empresas que comprovam cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da previdência social e que atendem às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, caso opte pelo benefício previsto no art. 3°, § 2°, inciso V, da lei n° 8.666/1993 e conforme a lei n° 14.133/2021.
- VIII- Que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do artigo 1° e inciso III do artigo 5° da constituição federal.
- IX- NÃO ter nenhum vínculo empregatício, de nenhuma natureza, com o referido município. Que não integra, no corpo social, nem no quadro funcional empregado público ou de sociedade de economia mista, ou membro comissionado de órgão direto ou indireto da administração municipal, na qual concorremos ao processo em epígrafe.
- X- Que os proprietários, sócios e/ou dirigentes da referida empresa NÃO possuem grau de parentesco consanguíneo (cônjuges, companheiros ou parentes) em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, com ocupantes de cargos de direção e de assessoramento; com servidores efetivos; agentes políticos; prefeito, vice-prefeito; nem com ocupantes de cargos em comissão deste município, responsabilizando-se civil, administrativa e criminalmente pela veracidade das informações contidas na presente declaração.
- XI- Para os devidos fins do disposto no art. 3° da lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu art. 34, e pelas leis complementares n° 147, de 07 de agosto de 2014, e lei complementar n° 155/2016, de 27 de outubro de 2016. Que se enquadra como **Micro empresa-me**, e que essa empresa está apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei complementar; a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos i e ii do art. 30 da lei complementar 123/2006; não é alcançada por qualquer hipótese de impedimento prevista do §4° do art. 3° da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

**DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60 / RUA: OXALÁ, N° 25 -
PARANGABA - FORTALEZA-CE, CEP: 60.740-560 / (85) 988031662 -
davidconstrucoes8@gmail.com**

#



XII- Que está ciente, conhece e entende os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração. Declara neste ato que: (a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção; (b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

XIII- Que o telefone: (85) 988031662, WhatsApp: (85) 988031662 e e-mail: davidconstrucoes8@gmail.com, são os meios de comunicação, ficando ciente que estes serão os meios de comunicação para contato/notificações/convocações, ficando desde já ciente que alguma alteração deverá ser comunicada imediatamente ao gestor do contrato, sob pena de penalização.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da lei.

Fortaleza-CE, 12 de julho de 2024.



Atenciosamente,

DAVID
CONSTRUCOES
LTDA:5271708
8000160

Assinado de forma
digital por DAVID
CONSTRUCOES
LTDA:527170800016
0
Data: 2024.07.12
09:03:34 -03'00'

David Construções
LTDA.

UESLEY OLIVEIRA DAVID
RG 2008302511-6 SSPDS-CE
CPF: 065.485.003-85
SÓCIO PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL LEGAL
DAVID CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 52.717.088/0001-60

davidconstrucoes8@gmail.com

Handwritten signature and initials in blue ink.

DAVID CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 52.717.088/0001-60 / RUA: OXALÁ, N° 25 -
PARANGABA - FORTALEZA-CE, CEP: 60.740-560 / (85) 988031662 -
davidconstrucoes8@gmail.com



RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PROPOSTAS DE PREÇOS

Tamboril-CE, 12 de setembro de 2024.

Declaro que a proposta da empresa abaixo enviada para a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tamboril foi verificada para constatação do atendimento as especificações previstas no **ANEXO IV - PROJETO BÁSICO** do edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 002/2024/CP**, como preços unitários necessários a execução de cada serviço com custos diretos e indiretos, tais como: materiais, custo de utilização de equipamentos, mão-de-obra, encargos sociais, impostos/taxas, insumos, BDI e quaisquer itens necessários a execução dos serviços.

<i>Empresa</i>
DAVID CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 52.717.088/0001-60

Destaca-se que a proposta da empresa **DAVID CONSTRUÇÕES LTDA** apresentou a proposta que **ATENDE** aos requisitos propostos pelo edital da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº. 002/2024/CP** para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE TAMBORIL-CE.**

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ EM DIVERSOS LOCAIS NO MUNICÍPIO DE TAMBORIL/CE		<i>Prazo de execução</i>
<i>Empresa</i>	<i>Valor da proposta</i>	
DAVID CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 309.517,98	90 dias

**JOAO VICTOR MARTINS
DA SILVA:07517171348**

Digitally signed by JOAO VICTOR MARTINS DA SILVA:07517171348
DN: cn=BR, ou=Videoconferencia,
serial=27842417001134, ou=IC, longname=ID Multiple,
o=ICP-Brasil, cn=JOAO VICTOR MARTINS DA SILVA:07517171348

João Victor Martins da Silva
Coordenador de Infraestrutura e Serviços Públicos
Engenheiro Civil – CREA 361415CE

(Handwritten signatures and initials)
